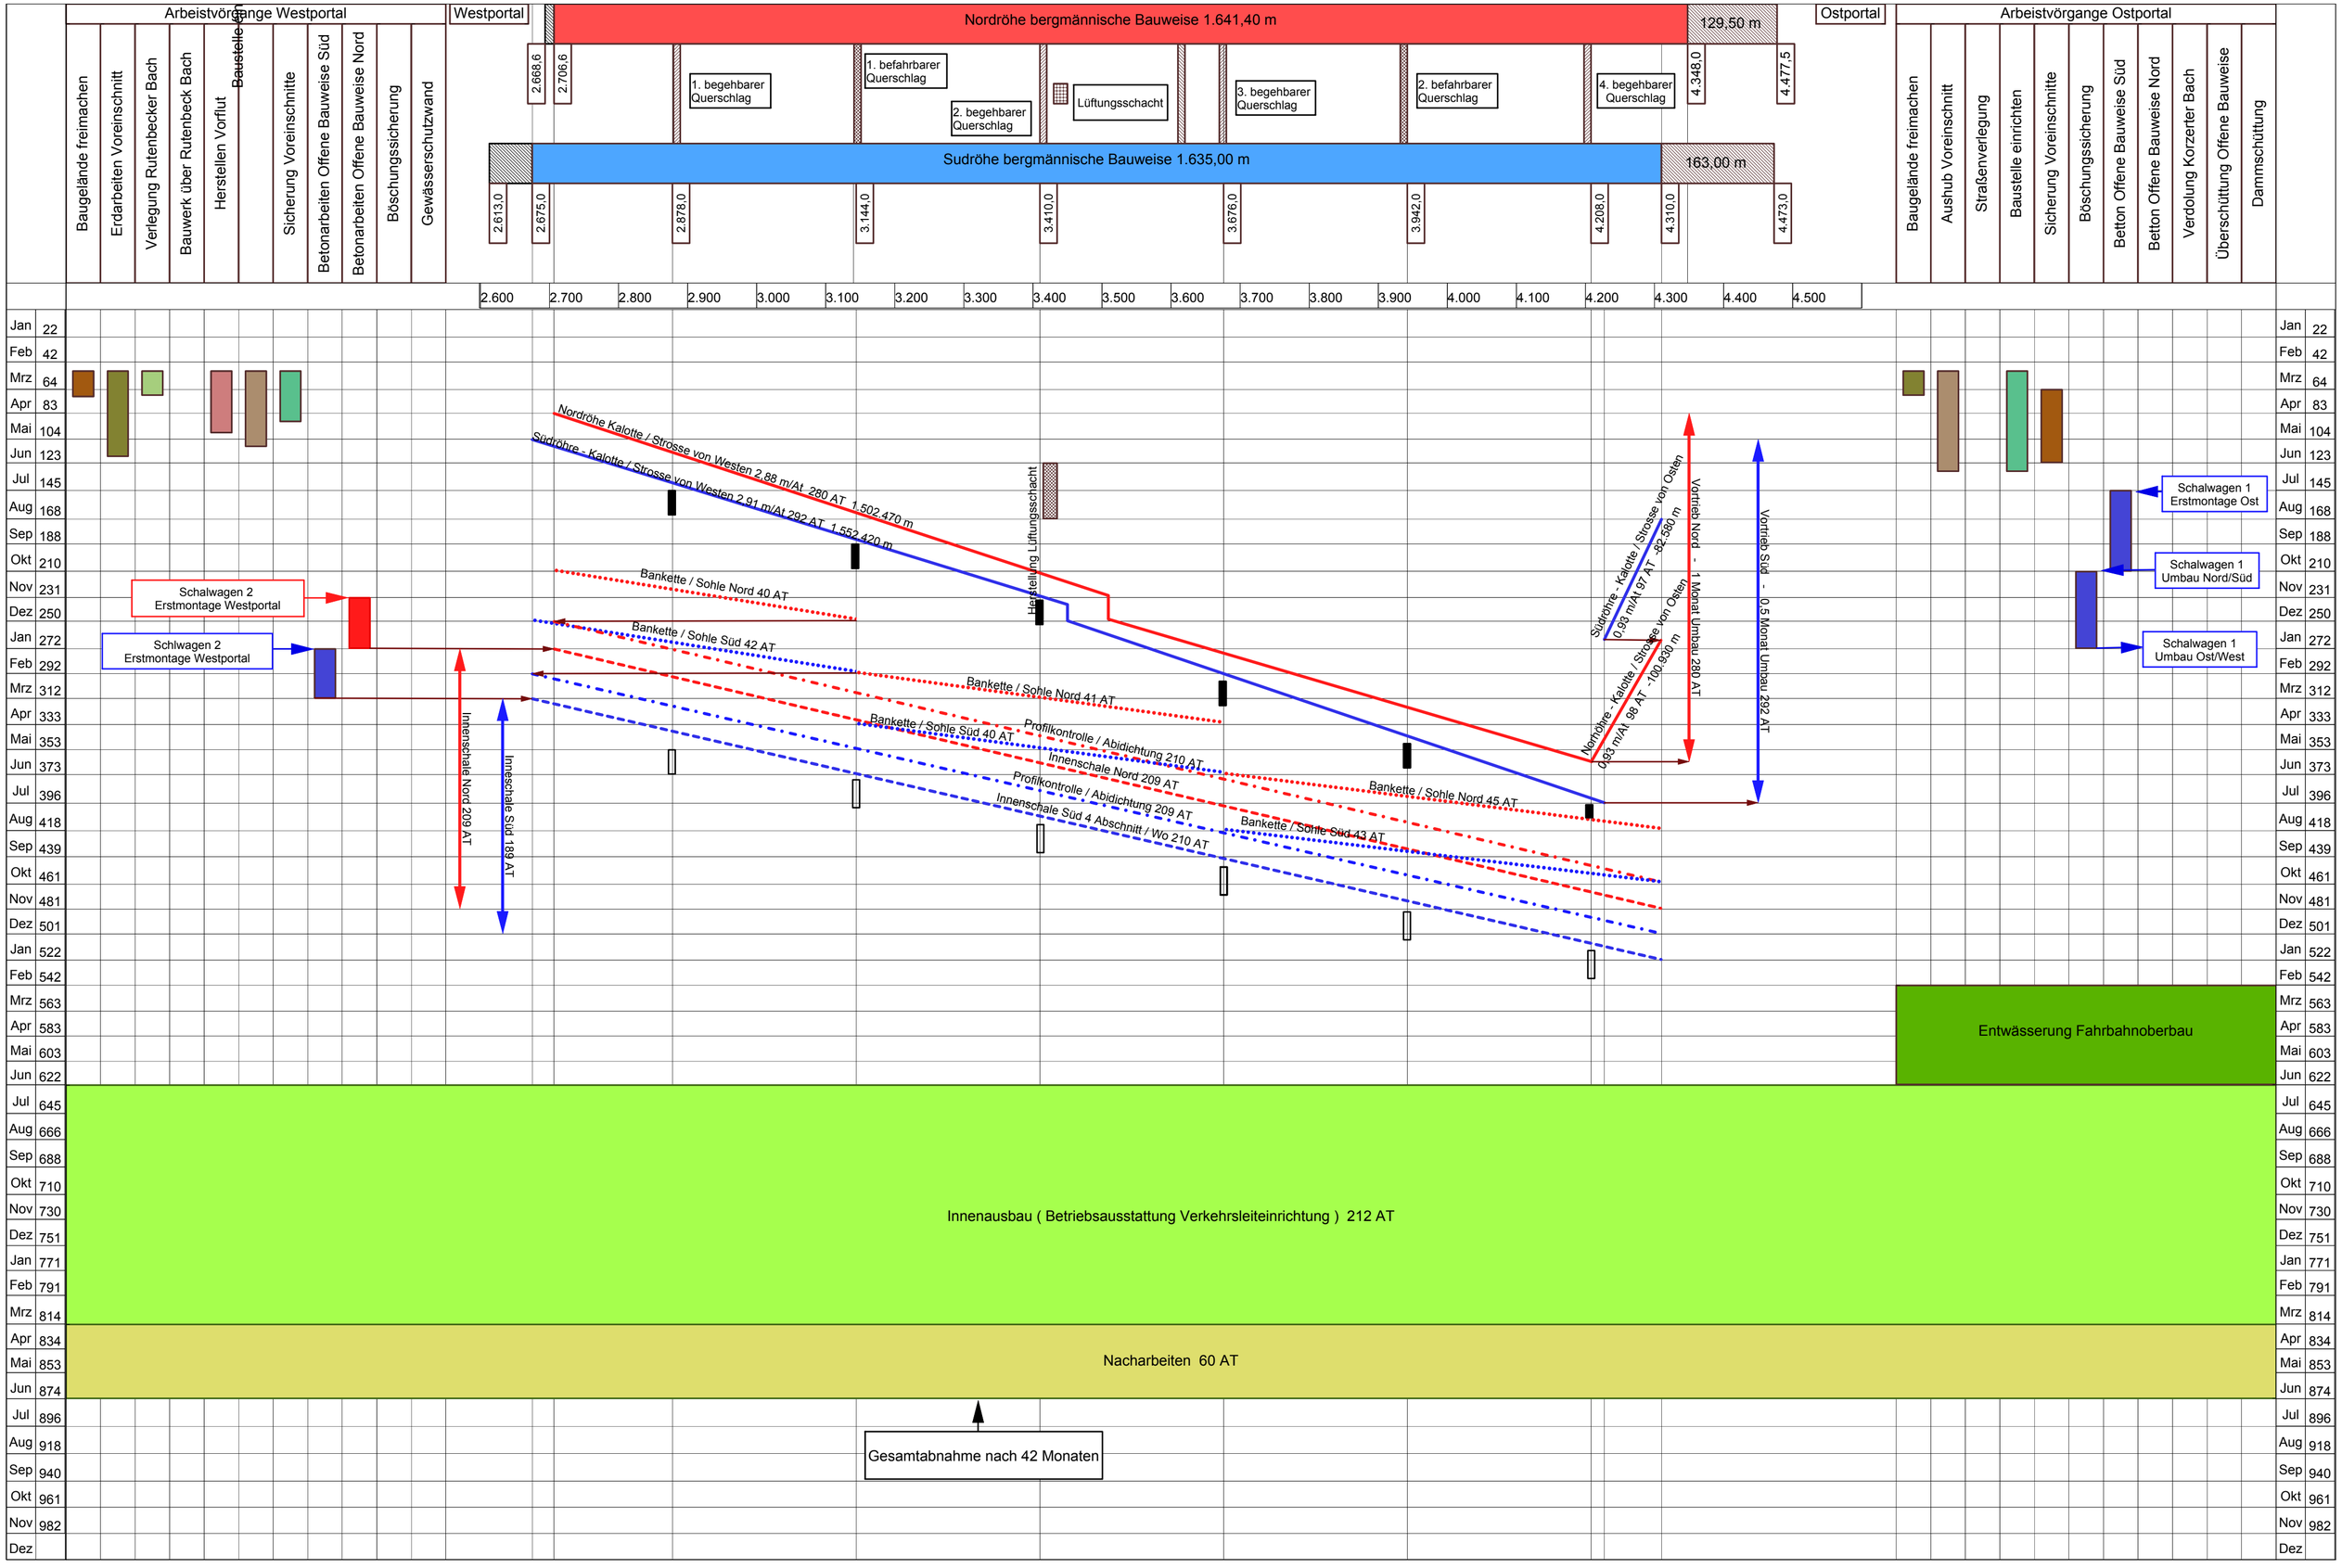
Arbeitsvörgänge Westportal
Baugelände freimachen
Erdarbeiten Voreinschnitt
Verlegung Rutenbecker Bach
Bauwerk über Rutenbeck Bach
Herstellen Vorflut
Baustelle
Sicherung Voreinschnitte
Betonarbeiten Offene Bauweise Süd
Betonarbeiten Offene Bauweise Nord
Böschungssicherung
Gewässerschutzwand
Westportal
Nordröhe bergmännische Bauweise 1.641,40 m
129,50 m
Ostportal
2.668,6
2.706,6
1. begehbarer Querschlag
1. befahrbarer Querschlag
2. begehbarer Querschlag
Lüftungsschacht
3. begehbarer Querschlag
2. befahrbarer Querschlag
4. begehbarer Querschlag
4.348,0
4.477,5
Sudröhe bergmännische Bauweise 1.635,00 m
163,00 m
2.613,0
2.675,0
2.878,0
3.144,0
3.410,0
3.676,0
3.942,0
4.208,0
4.310,0
4.473,0
Arbeitsvörgange Ostportal
Baugelände freimachen
Aushub Voreinschnitt
Straßenverlegung
Baustelle einrichten
Sicherung Voreinschnitte
Böschungssicherung
Betton Offene Bauweise Süd
Betton Offene Bauweise Nord
Verdolung Korzerter Bach
Überschüttung Offene Bauweise
Dammschüttung
2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 4.500
Jan 22 Feb 42 Mrz 64 Apr 83 Mai 104 Jun 123 Jul 145 Aug 168 Sep 188 Okt 210 Nov 231 Dez 250 Jan 272 Feb 292 Mrz 312 Apr 333 Mai 353 Jun 373 Jul 396 Aug 418 Sep 439 Okt 461 Nov 481 Dez 501 Jan 522 Feb 542 Mrz 563 Apr 583 Mai 603 Jun 622 Jul 645 Aug 666 Sep 688 Okt 710 Nov 730 Dez 751 Jan 771 Feb 791 Mrz 814 Apr 834 Mai 853 Jun 874 Jul 896 Aug 918 Sep 940 Okt 961 Nov 982 Dez
Nordröhe Kalotte / Strosse von Westen 2,88 m/At 280 AT 1.502,470 m
Südröhre - Kalotte / Strosse von Westen 2,91 m/At 292 AT 1.552,420 m
Herstellung Lüftungsschacht
Bankette / Sohle Nord 40 AT
Bankette / Sohle Süd 42 AT
Bankette / Sohle Nord 41 AT
Bankette / Sohle Süd 40 AT
Profilkontrolle / Abidichtung 210 AT
Innenschale Nord 209 AT
Profilkontrolle / Abidichtung 209 AT
Innenschale Süd 4 Abschnitt / Wo 210 AT
Bankette / Sohle Nord 45 AT
Bankette / Sohle Süd 43 AT
Südröhre - Kalotte / Strosse von Osten 0,93 m/At 97 AT -92.580 m
Nordröhre - Kalotte / Strosse von Osten 0,93 m/At 98 AT -100.930 m
Vortrieb Nord - 1 Monat Umbau 280 AT
Vortrieb Süd - 0,5 Monat Umbau 292 AT
Schalwagen 2 Erstmontage Westportal
Schlwagen 2 Erstmontage Westportal
Innenschale Nord 209 AT
Inneschale Süd 189 AT
Schalwagen 1 Erstmontage Ost
Schalwagen 1 Umbau Nord/Süd
Schalwagen 1 Umbau Ost/West
Entwässerung Fahrbahnoberbau
Innenausbau (Betriebsausstattung Verkehrsleiteinrichtung) 212 AT
Nacharbeiten 60 AT
Gesamtabnahme nach 42 Monaten
